

NOTE DE CADRAGE

Geometrical Space

Sommaire

I. Qui est notre client ? _____	Page n°2
II. Quel projet avons-nous à faire ? _____	Page n°2
III. Combien de temps avons-nous ? _____	Page n°3
IV. Participants au projet : _____	Page n°3
V. Dans quelles conditions le jeu sera créer ? _____	Page n°4
VI. Grands axes du projet par rapport au temps : _____	Page n°4
VII. Listage des tâches de développement : _____	Page n°4
VIII. Gestion des moyens : _____	Page n°7
IX. Gestion du budget : _____	Page n°7
X. Milestones : _____	Page n°8

I. Qui est notre client ?

Notre client est l'école supérieure spécialisée dans le domaine du jeux vidéo, elle est nommée, La Horde, nous devons leur rendre un jeu de type Bullet Hell, ainsi que tous les documents nous aillant permit de créer le projet, le lien vers le GitHub du projet est aussi demandé.

II. Quel projet avons-nous à faire ?


Nous avons à créer un jeu de type Bullet Hell sur le moteur Unity, l'exemple de jeu présenter par notre client est le jeu Touhou, le nom du jeu que nous rendrons sera Geometrical Space.

L'objectif du joueur dans le jeu, sera de rester en vie jusqu'à la fin du niveau, via l'esquive de très nombreux projectiles mortels, il devra en même temps, détruire les vaisseaux / boss lui tirant dessus, cependant les groupes de vaisseaux ne restent pas sur l'écran jusqu'à être détruit.

Le joueur gagnera du score via la destruction de vaisseaux + boss, chaque ennemie aura sa propre valeur de score.

III. Combien de temps avons-nous ?

J'ai analysé le temps disponible que nous aurons :

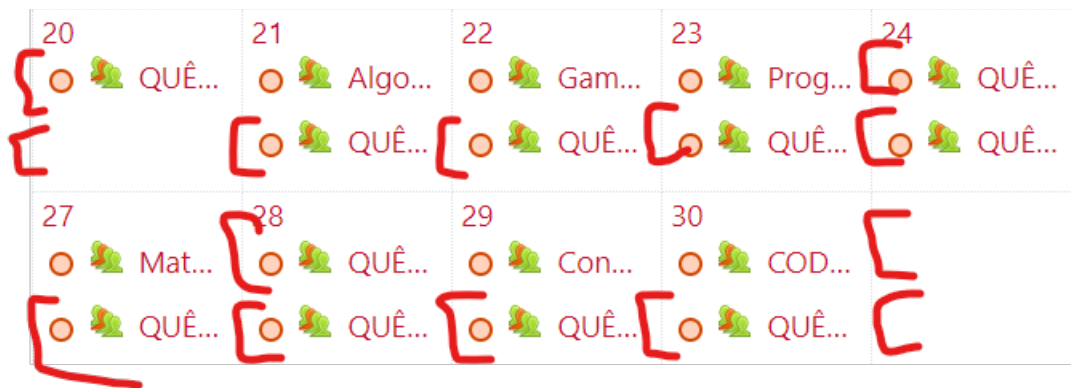

On considère qu'une demi-journée le matin est équivalent à 2h45 (en comptant la pause de 15 minutes), et qu'une demi-journée l'après-midi est équivalent à 3h45 (en comptant la pause de 15 minutes)

La Deadline du rendu des livrables est le Vendredi 01/12/2023 à 17h30.

Si on additionne toutes les heures disponibles du Lundi 20/11/2023 à la Deadline, on aura :

48h30 de disponible

Calcul du temps total du projet :			
Matin :		Après-midi :	
02:45:00	4	03:45:00	10
11:00:00		37:30:00	
48:30:00			

IV. Participants au projet :

- Alexandre RICHARD | Game Designer, Développeur

V. Dans quelles conditions le jeu sera créer ?

Les documents du jeu, et le développement de ce dernier seront fait dans les locaux de La Horde.

Le temps de développement du jeu étant particulièrement cours, le jeu devra être simple au possible.

VI. Grands axes du projet par rapport au temps :

Étant donné que la Note de Cadrage se fait avant la création d'un GDD, nous ne pouvons pas prévoir précisément les tâches que l'équipe devra accomplir, cependant nous pouvons lister les grands axes du projet :


Index :	Axes du projet :	Temps disponible :
1	Création de la Note de Cadrage	2h45
2	Création du GDD	7h30
3	Développement du jeu	30h45
4	Temps d'imprévu	7h30

VII. Listage des tâches de développement :

Malgré que le GDD ne soit pas encore créer, nous pouvons cependant prévoir plus précisément les tâches par lesquels nous allons passer durant la phase de développement.

Index :	Tâches :	Temps alloué :
1	Créer le GitHub, et le lier au projet Unity avec les dossiers de créer, ainsi que les packages	0h56
2	Faire la caméra en vu paysage 16:9	0h56
3	Faire les contrôles du jeu (ZQSD/WASD), clic souris + contrôles manette	0h56
4	Caractère contrôlé par le joueur (système de déplacement)	0h56

5	Système de tir, inflige un certains nombre de dégâts à un ennemie	1h53
6	Création d'un ennemie pouvant prendre des dégâts, tirer des projectiles en ligne droite qui one shot le joueur, ainsi que mourir quand leurs PV tombe à zéro	1h53
7	Créer le système de déplacement des ennemies + si un ennemie entre en collision avec un joueur ça le tue	6h30
8	Changer le système de tir des ennemies afin qu'ils tirent des projectiles qui se déplacent en angle	2h45
9	Créer le système de score le joueur gagnera des point de score lorsque qu'il détruira des ennemies	1h53
10	Créer les UIs de défaite (affiché un texte : Vous êtes mort, le score du joueur, deux boutons, un pour relancer une partie, un pour quitter)	0h56
11	Faire que le nombre d'ennemie qui spawn augmente selon le score du joueur (plus il est élevé, plus les ennemies seront nombreux à spawn)	0h56
12	Mise en place de tout les graphismes	6h30

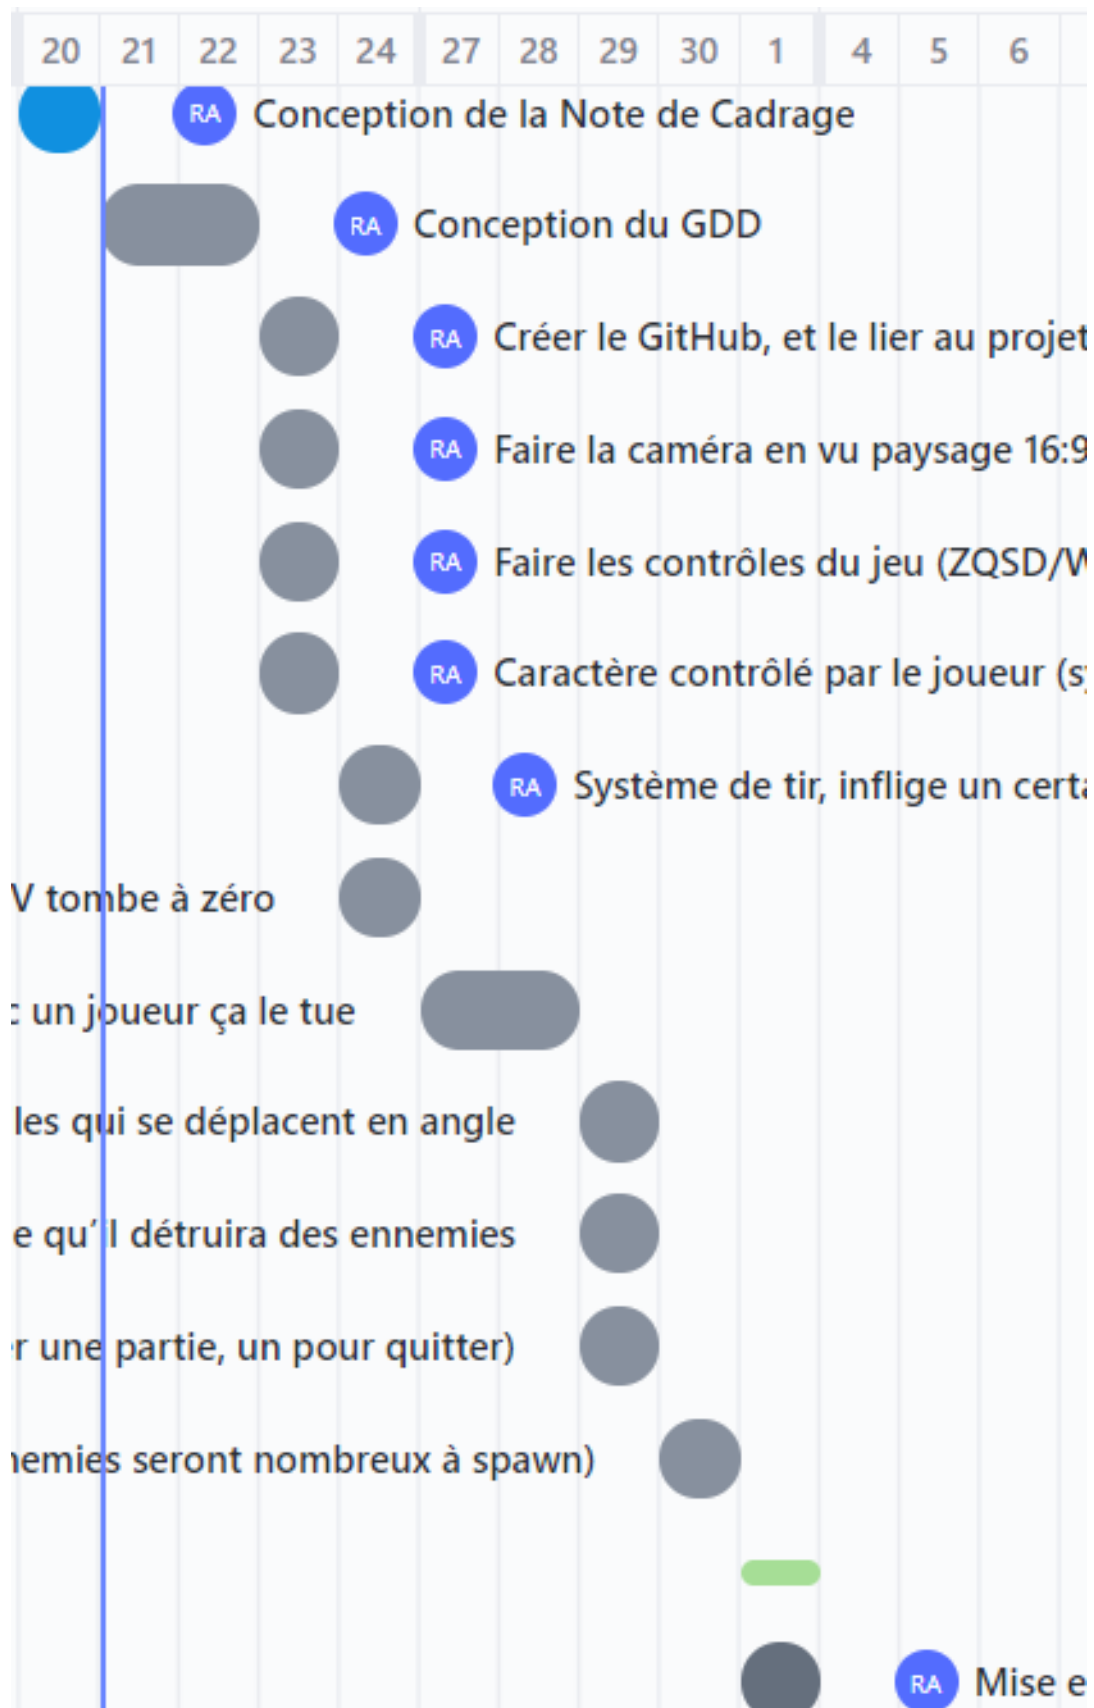

VIII. Gestion des moyens :

Moyens totaux du projet :								
Humains :			Techniques :			Communications :		
Nom :	Nombre :	Salaire brut par jour (sans charge patronal) :	Nom :	Nombre :	Prix :	Nom :	Nombre :	Prix :
Producer junior	0	100,00 €	Licence Moteur Unity	1	0,00 €	Discord	1	0,00 €
Producer sénior	0	233,33 €	Licence Moteur Unreal Engine	0	0,00 €			
Chef de projet junior	0	83,33 €	Électricité (en kW/h) consommé par jour	6,4	0,23 €			
Chef de projet sénior	0	123,33 €	GitHub	1	0,00 €			
Game Designer junior	0	100,00 €	ClickUp	1	0,00 €			
Game Designer sénior	0	125,00 €	LibreOffice	1	0,00 €			
Développeur junior	1	83,33 €	Windows	1	0,00 €			
Développeur sénior	0	116,66 €						
Game Tester junior	0	69,44 €						
Game Tester sénior	0	107,77 €						
Graphiste junior	0	66,66 €						
Graphiste sénior	0	83,33 €						
Compositeur musical junior	0	60,26 €						
Compositeur musical sénior	0	205,53 €						

IX. Gestion du budget :

Calcul du budget total du projet :				
Salaires :		Techniques :		Communications :
Salaire de tous les salariés par jour en brut :	Pourcentage de charge patronale :	Prix de l'électricité pour tout le projet :	Prix des autres moyens technique à l'instant t :	Somme total des coûts de communications : 0,00 €
83,33 €	35,00 %	14,57 €	0,00 €	
Salaire total à payer par jour :	112,50 €	Somme total des coûts techniques :		
Salaire total à payer pour le projet :	1 124,96 €	14,57 €		
Budget total du projet : 1 139,52 €				

Afin que le projet prennent vie, il faudra dépenser la somme de **1 139,52 €**

X. Milestones :

Au cours de la production, des milestones seront atteints, une phase de QA sera effectuée après chaque phase, si les QA détectent un bug/problèmes, alors il faudra régler le/les problèmes, et relancer une phase de QA, jusqu'à qu'il n'y est plus aucun bug/problèmes détectés.

On peut dénombrer 3 milestones :

- Phase 1 : Implémentation du MVP / base du jeu
- Phase 2 : Implémentation des Visuels + Feedbacks
- Phase 3 : Ajout de nouvelles features

Détails des tâches par phases :

Phase 1 :	Phase 2 :	Phase 3 :
- Créer le GitHub, et le lier au projet Unity avec les dossiers de créer, ainsi que les packages	- Mise en place de tout les graphismes ainsi que des feedbacks	- Ajout de nouvelles features
- Faire la caméra en vu paysage 16:9		
- Faire les contrôles du jeu (ZQSD/WASD), clic souris + contrôles manette		
- Caractère contrôlé par le joueur (système de déplacement)		
- Système de tir, inflige un certains nombre de dégâts à un ennemie		
- Création d'un ennemie pouvant prendre des dégâts, tirer des projectiles en ligne droite qui one shot le joueur, ainsi que mourir quand leurs PV tombe à zéro		
- Créer le système de déplacement des ennemies + si un ennemie entre en collision avec un joueur ça le tue		

- Changer le système de tir des ennemies afin qu'ils tirent des projectiles qui se déplacent en angle		
- Créer le système de score le joueur gagnera des point de score lorsque qu'il détruira des ennemies		
- Créer les UIs de défaite (affiché un texte : Vous êtes mort, le score du joueur, deux boutons, un pour relancer une partie, un pour quitter)		
- Faire que le nombre d'ennemie qui spawn augmente selon le score du joueur (plus il est élevé, plus les ennemies seront nombreux à spawn)		
